


SITUACE ZOV - 2.FÁZE
1.ETAPA - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, ZSJ, NOVÉ PŘÍPOJKY

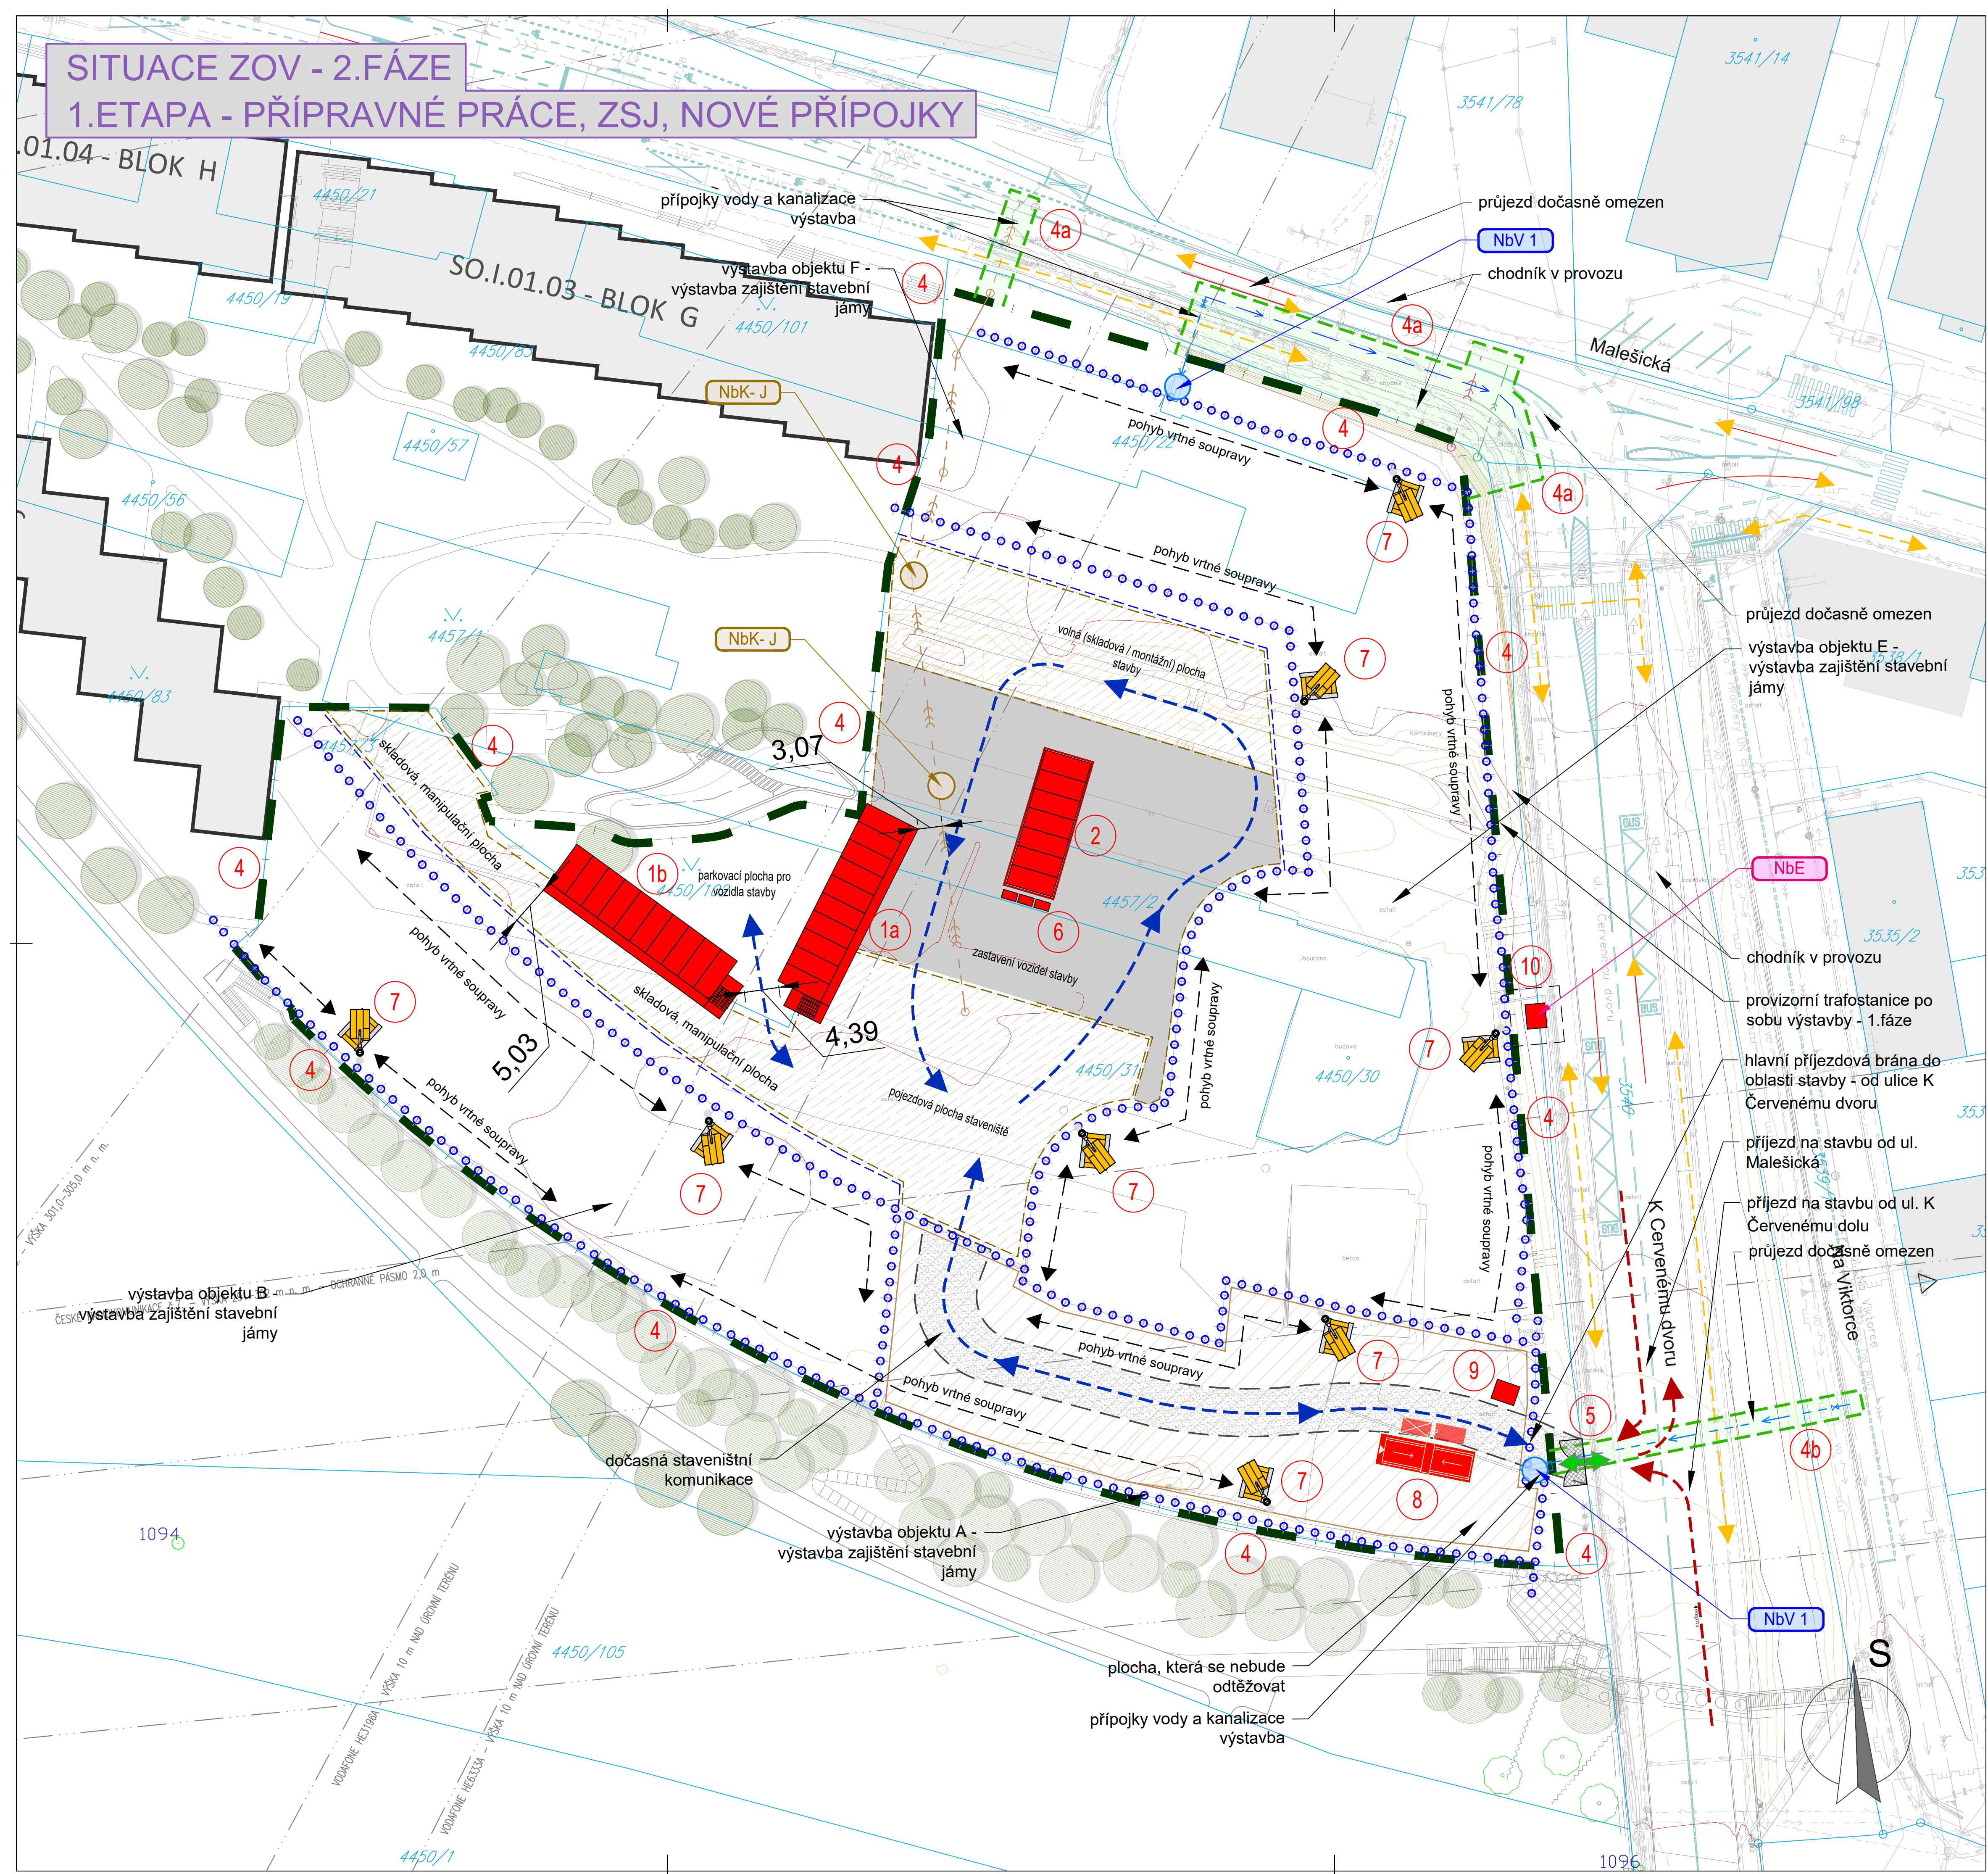

LEGENDA:

- VYMEZENÁ HLAVNÍ PLOCHA STAVENÍŠTĚ - POZEMEK STAVENÍŠTĚ
- PRVKY ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- ZAKÁZANÁ MANIPULACE JEŘÁBU S BŘEMENEM
- PŮVODNÍ ASFALTOVÁ PLOCHA - VYUŽITÍ PRO STAVBU
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA STAVBY - PŘÍJEZDOVÁ CESTA DO PROSTORU STAVENÍŠTĚ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA STAVBY - SKLADOVÁ / MONTÁŽNÍ PLOCHA
- KRÁTKODOBÝ ZÁBOR - NOVÉ PŘÍPOJKY IS
- ZAMĚŘENÍ A STAV. SÍŤ
- KATASTR
- PŘÍJEZD / ODJEZD NA / ZE STAVBY
- MIMO STAVENÍŠTNÍ DOPRAVA
- VNITROSTAVENÍŠTNÍ DOPRAVA
- PĚŠÍ TRASY KOLEM STAVENÍŠTĚ
- OSTATNÍ VEŘEJNÁ DOPRAVA
- VJEZD / VÝJEZD ZE / NA STAVBU
- NbE
- NbV
- NbK - J
- NAPOJENÍ NA JEDNOTNOU KANALIZACI - NOVÝ ŘAD K OBJEKTU A, B

LEGENDA PRVKŮ ZS:

- 1 stavební buňky - zázemí stavby 2 x 2 x 10 = 40 buňek
- 2 skladová buňka
- 4 vymezený hlavní prostor stavby - pozemek investora - oplocen
- 4a krátkodobý zábor v ul. Malešická
- 4b krátkodobý zábor v ul. K Červenému dvoru
- 5 označení hlavního vjezdu / výjezdu z / do prostoru staveniště - ul. K Červenému dvoru
- 6 staveništní rozvaděč
- 7 vrtná souprava - počet souprav v kompetenci zhotovitele stavby
- 8 oplachová plocha - výjezd ul. ze staveniště
- 9 vrátnice / ostraha
- 10 dočasná TS - pro stavbu (po dokončení nové TS bude stavba přepojena)


Předpokládaná doba výstavby objektu:
26 - 28 měsíců

Předpokládaná doba 1. etapy:
cca 60 dní - 2 měsíce
(zajištění stavební jámy, přípravné práce, přípojký IS pro stavbu)

POZNÁMKA:

- nápojný bod el. energie je označen NbE - napojení bude z TS v ul. K Červenému dvoru
- nápojný bod vody je označen NbV
- nápojný bod kanalizace je označen NbK
- příjezdová a odjezdová komunikace do oblasti stavby je z komunikace ul. K Červenému dvoru - Malešická
- Na výjezdu ze stavby musí být osazeny dopravní značky upravující pohyb vozidel při výjezdu ze staveniště
- před výjezdem na staveništní komunikaci bude umístěna plocha pro očistu vozidel stavby
- tato dokumentace je zpracována dle vyhlášky 131/2024 Sb. v platném znění, dle přílohy č.8., dokumentace pro provedení

00/00/0000	[titul] Přijetí	[titul] Přijetí	Text
DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

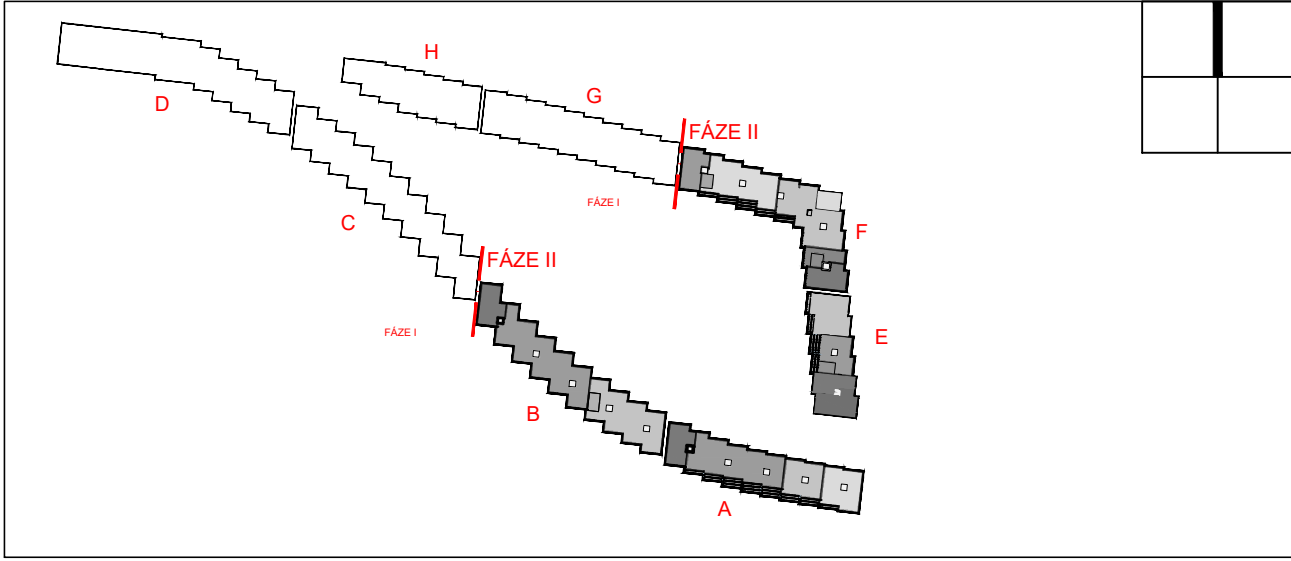

± 0,00 = 264,95 m n.m. Bpv

INVESTOR:
Residence Nový Žižkov a.s.
Na Florenci 2139/2
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 272 20 397

ARCHTEKT:
BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS
Generaal Vetterstraat 61
1059 BT Amsterdam
THE Netherlands
TEL: +31 20 642 0105

STUPRO ARCHITECTS
ra15 a.s.
Výhledská 1376/45, 128 00 Praha 2
T: +420 257 217 217 / W: ra15.cz

GENÉRALNÍ PROJEKTANT:
STOPRO SPOL. S R.O.
Radická 90/137, 158 00 Praha 5
tel.: 251 981 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing. Petr Ocásek
Štefaníkova 623
Kralupy nad Vltavou 278 01

VYPRACOVAL:
Ing. Petr Ocásek

AKCE:
Residence Nádraží Žižkov
K Červenému dvoru, Praha 3 - Žižkov

STUPNĚ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

HLAVNÍ OBJEKT:
DS.I. Dočasné stavby

ČÁST:
Zásady organizace výstavby (ZOV)

OZNAČENÍ:
C_4_1

NÁZEV:
Situace ZOV
F2-E1
- ZSJ + přípravné práce, přípojký IS

DATUM:	02/2026	FORMAT:	594 x 840	MĚŘÍTKO:	1:400	PÁRE:	
KÓD PROJEKTU:	RNZ	STUPNĚ:	DSP	OBJEKT:	DSI01		
ZODPOVÍDÁ:		PROFESE:	ZOV	Č.V.:	001	REVIZE:	00
